

INFORMATIVO N°2 Avance del Desarrollo y ejecución del proyecto de extensión de redes de agua potable Las Colonias de Paine Cooperativa, Municipalidad y Junta de Vecinos



Hospital, 30 de julio 2021

Fase 1 de Construcción: (Total Proy. 2.155 mill. 50% 1.078 mill.)

Contempla la Instalación de 1.850mts. de alimentadora en PVC, D=200mm. y 958 mts. en D=110mm, hasta Condominio Comunidad Las Camelias y Habilitación Pozo Champa  .

Total Redes Proy.: 31,1 Km. Total Proyecto.

Red Instalada:  2.635 mts. D=200 y D=110mm.

Avance Redes:  8,5%

Por Instalar: 28,5 Km.

Total Arranques Proy.: 550

Total Registrados: 305

De los 305, Cumplen con el 50% : 121

22%.


Ingresos para Inicio: 538,9 mill.

A la Fecha: 184,0 mill. 34%

+ Muni. Tot: 284,0 mill. 53%

Total Gastos a la Fecha: **143,6 mill.**

Desde 2014 Diseño, Asesor, Tubos, Piezas, HH. Obras.

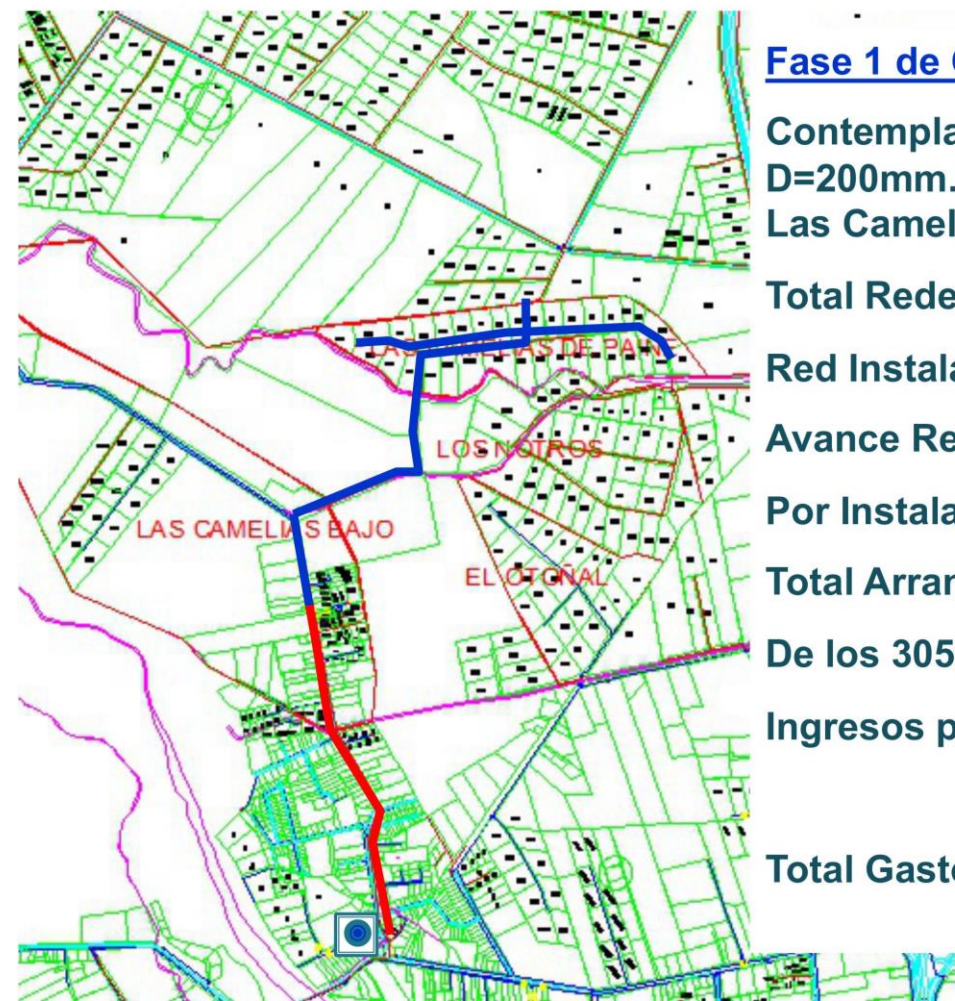



Fase 1 de Construcción: ...continuación

- ▶ Con fecha 14 de Dic. de 2020 se da Inicio de las obras, comenzando por el condominio Comunidad las Camelias, que dio servidumbre de paso para pasar por su camino interior y así poder llegar con la red troncal al sector de Las Colonias de Paine.
- ▶ Se continúa con la instalación de la red en D=200mm. en dirección plaza Champa donde se conectará al sistema producción Champa.
- ▶ En tramo hacia Champa se contempla la rotura y reposición de más de 1.000 mts. de veredas.
- ▶ La cooperativa previo inicio de obras compra 4.920 mts. PVC, D=200mm. y 4.194 mts. PVC, D=110mm. Total 55 mill.
- ▶ Se suspendieron trabajos en 3 oportunidades por contagios COVID, provocando retrasos en las obras.
- ▶ A la fecha se están instalando tuberías de 200 mm en Las Camelias bajo en dirección Plaza Champa.
- ▶ Se contempla poner en operación esta tubería alimentadora principal de agua potable en noviembre – diciembre 2021.
